

工事概要



■工事名称

・(仮)令和6年度 歴史・文化拠点施設整備事業 伊豆の国市文化財展示施設整備工事

■主要用途・面積・構造

・主要用途：展示場
・面積：延床面積 1,236.91㎡・建築面積 589.54㎡
・構造：鉄骨造 3階建

■地名地番・敷地面積

地名地番：伊豆の国市四日町800番地1他(葦山文化センター駐車場敷地内)
敷地面積：998.50㎡

■都市計画・地域地区

都市計画：市街化調整区域 防火地域：指定なし
地域地区：用途地域指定なし その他の区域：法22条区域

■建蔽率・容積率

建蔽率 60%・容積率 200%

■日影規制

平均地盤面からの算定高さ・・・4m
敷地境界線より5mを超え、10m以内の範囲 2.5時間
敷地境界線より10mを超える範囲 4.0時間

■前面道路

名称・・・市道葦355号線
道路幅員・・・9.33m

計画敷地




■拠点となる立地

建設予定地は、「葦山反射炉」「江川家住宅」「北江間横穴群」等、市内史跡の中心に位置する。
また、徒歩5分圏内に「伊豆箱根鉄道 葦山駅」があり、今回敷地が「葦山時代劇場 駐車場内」のため
児童・学生の郷土学習及び来館者の市内周遊の導入ができ、歴史と人をつなぐ拠点となることを期待する。

■葦山時代劇場との連携が可能

「新設 文化財展示施設」を市民・見学者の学びの場とし、目的・テーマに応じた各種展示施設設けるほか、隣接する「葦山時代劇場」の各施設と一体的な利活用により、参加型・体験型の学習機能を確保する。
「葦山時代劇場」と連携したプログラムを行うことにより、郷土学習・利用者交流が活性化し、新施設がこの地に成ること・市民がこの地に生きること・利用者がこの地に訪れたことの意味がより一層深まる。

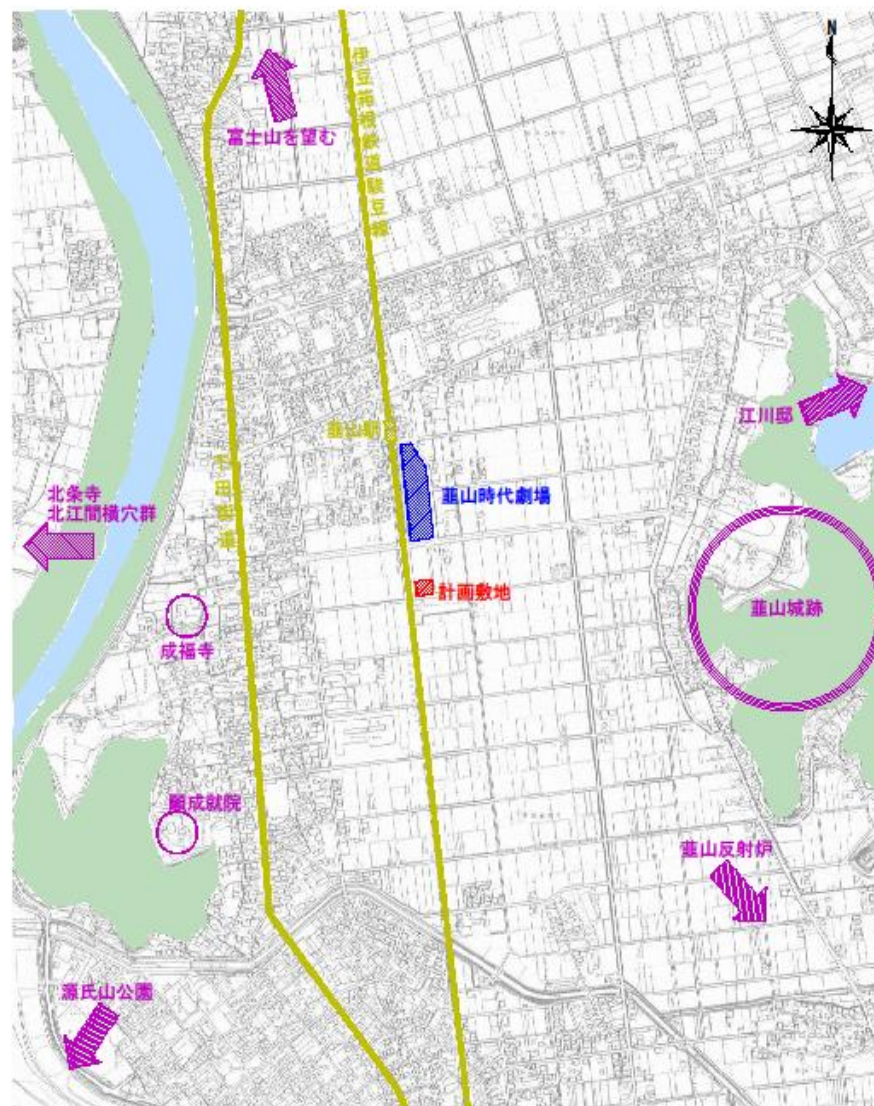

敷地案内図 S=N.S

project	company name	drawing	scale	Date	architect	No.
令和6年度 歴史・文化拠点施設整備事業 伊豆の国市文化財展示施設整備事業 基本設計	株式会社 ヴァイスプランニング	仕様概要書・敷地案内図	—	—	—	03

令和6年度 歴史・文化拠点施設整備事業 伊豆の国市文化財展示施設建設工事															現場代理人	作成者
工 事 種 別	年 月 日	令和7年2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和8年1月	2月	3月	備 考
		15 30	15 31	15 31	15 31	15 31	15 31	15 31	15 31	15 31	15 31	15 31	15 31	15 31	15 27	
仮設工事			起工式事務所・仮囲い			地足場		外部足場					仮囲い解体		各種検査	
外構工事													外構工事			
外装工事										外装仕上げ		屋上防水				
内装(仕上)工事												内装仕上げ				
内装(下地)工事												LGS・ボード・棟				
断熱・耐火工事												EV設置				
建具工事											耐火被覆・ウレタン吹付		建具・ガラス取付			
コンクリート工事							基礎Con	土間・デッキ・立上り壁Con								
鉄骨工事								鉄骨建方・デッキ・胴縁								
基礎工事						掘削・基礎・埋戻し										
地業工事			製作			杭工事										
電気設備工事			仮設			スリーブ・埋設配管等		配線・配管・器具付け								
機械設備工事			仮設			スリーブ・埋設配管等		配線・配管・器具付け								
年 月 日		令和7年2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和8年1月	2月	3月	
進捗歩合		0%	1%	1%	7%	14%	18%	31%	43%	52%	61%	74%	86%	97%	100%	
現場状況				杭工事完了		埋戻し完了 地中部分完了		鉄骨建方完了		屋根・外壁完了		建物本体完了		建設工事完了		

【建物概要（イメージパース）】



【建物概要（イメージパース）】



着手前



工事名	令和6年度 豊後・大分地区防災対策事業 伊予の国大分地区防災施設建設工事		
工種		測点	
着手前			
2025/02/20			

○着手前
現場
西 → 東



工事内容	令和6年度 豊後・大分地区防災対策事業 伊予の国大分地区防災施設建設工事		
工種	土工事		
種別	土工状況		
撮影場所	R7.6.2		
撮影年月日		施工種別	国土建設株式会社

○建物部分
アスファルト掘削
完了

工事内容	山形県立川口高等学校校舎新築工事（体育館・校舎）
工種	仮設工事
種別	仮囲い
仮囲い	
R7.7.2	
撮影年月日	2025/07/03 機 工 機

○北面仮囲い

工事内容	山形県立川口高等学校校舎新築工事（体育館・校舎）
工種	仮設工事
種別	施工状況
仮囲い・種別	クロスゲート
設計数量	W8000mm H2000mm
実測値	W8000mm H2000mm
R7.4.21	
撮影年月日	機 工 機 山形建設株式会社

○アコーディオンゲート
設置

○北面仮囲い



○アコーディオンゲート 設置



○杭打ち機
重さ 114t
ガイド 23m

工事内容	新築分譲住宅 21区画分譲住宅敷地造成工事(21区画分譲住宅敷地造成工事)
機 種	杭工機
機 種	特 別 機 工 機 種
Hydropneumatic工法(砂質、硬質地盤)	
打込深 (6m)	
減速キャリブレーション	
減速制御部	
R7.5.15	
撮影年月日	機 工 機 種 (山本建設株式会社)

[illegible]

工事内容
工種：杭工事
機 型：改良機
Hyper-ストレート工法 No.14
01
作業状況
材料 TAFCO-PHC-A 9m
1本 TAFCO-PHC-A 8m
市販 TAFCO-PHC-B 8m
土質 WT-SC-II (types) 7m
R7.5.26
撮影年月日 施 工 場（山形建設株式会社）

工 事 件 名	9月15日現在 三山建設株式会社東京支店の解体工事と基礎杭工事		
工 種	杭工事		
種 別	掘工状況		
Hyper-スレート工法 No.14			
P1			
杭建込状況			
下杭	TAFCO-PHC-A	9m	
中2杭	TAFCO-PHC-A	9m	
中1杭	TAFCO-PHC-B	9m	
O上杭	HIT-SCⅡ (TypeS)	7m	
R7.5.26			
撮影年月日	施 工 者	三山建設株式会社	

[illegible]

○機械掘削状況

○掘削完了
掘削量 979 m³
↓
大型ダンプ
約 160 台

工事名称	中野川環境改善事業（中野川）左岸（上流）護岸工事（第1工区）		
工種	土工		
種別	施工状況		
基礎掘削施工状況			
X4-Y3,Y4掘り			
R7.6.2			
撮影年月日	施工者 山本建設株式会社		

鉄筋工事




○基礎・配筋状況



○基礎・地中梁
配筋 全景

型枠工事

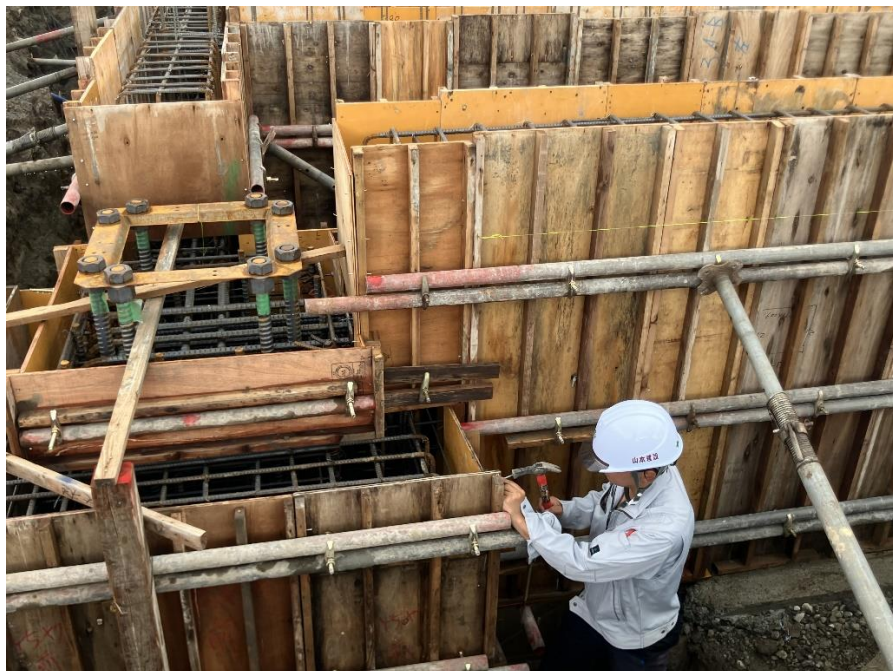

○基礎・型枠工



○型枠完了・全景

コンクリート打設工事



○コンクリート打設
全景

コンクリートミキサー車
から
コンクリートポンプ車へ

コンクリート 260 m³

コンクリートミキサー車
約 58 台



○コンクリート打設
状況

